



Comune di OVODDA
Provincia di Nuoro

09_CRONOPROGRAMMA

PROGETTO ESECUTIVO
(Livello di progettazione conforme all'Art. 3, Codice Contratti)



OGGETTO: SISTEMA DI ILLUMINAZIONE ARREDANTE PARCHI PUBBLICI

COMMITTENTE COMUNE DI OVODDA – *Via Sassari n. 4 08020 – OVODDA (NU)*

IL PROGETTISTA



(Dott. Ing. Giorgio CURRELI)

IL COMMITTENTE

(Comune di Ovodda)

Ovodda, ottobre 2018



Dott. Ing. Giorgio Curreli
Via G. Deledda, 4
08020 Ovodda (NU)
Tel. 3292444700
e-mail: giorgio.curreli@alice.it

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	03/12/2018	03/12/2018
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1	03/12/2018	03/12/2018
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	2	2	04/12/2018	05/12/2018
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	2	2	06/12/2018	07/12/2018
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	10/12/2018	10/12/2018
Smobilizzo del cantiere	1	E	4	4	04/03/2019	07/03/2019
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	4	4	11/12/2018	14/12/2018
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1	E	3	3	17/12/2018	19/12/2018
Scavo a sezione ristretta	1	E	3	3	19/12/2018	21/12/2018
Realizzazione di impianto elettrico interno	1	E	9	13	02/01/2019	14/01/2019
Posa di conduttura elettrica	1	E	10	12	14/01/2019	25/01/2019
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	1	E	4	8	24/12/2018	31/12/2018
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1	E	5	5	28/01/2019	01/02/2019
Rinterro di scavo	1	E	5	5	04/02/2019	08/02/2019
Posa di pali per pubblica illuminazione	1	E	6	8	08/02/2019	15/02/2019
Montaggio di apparecchi illuminanti	1	E	10	12	18/02/2019	01/03/2019

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA


Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>









gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

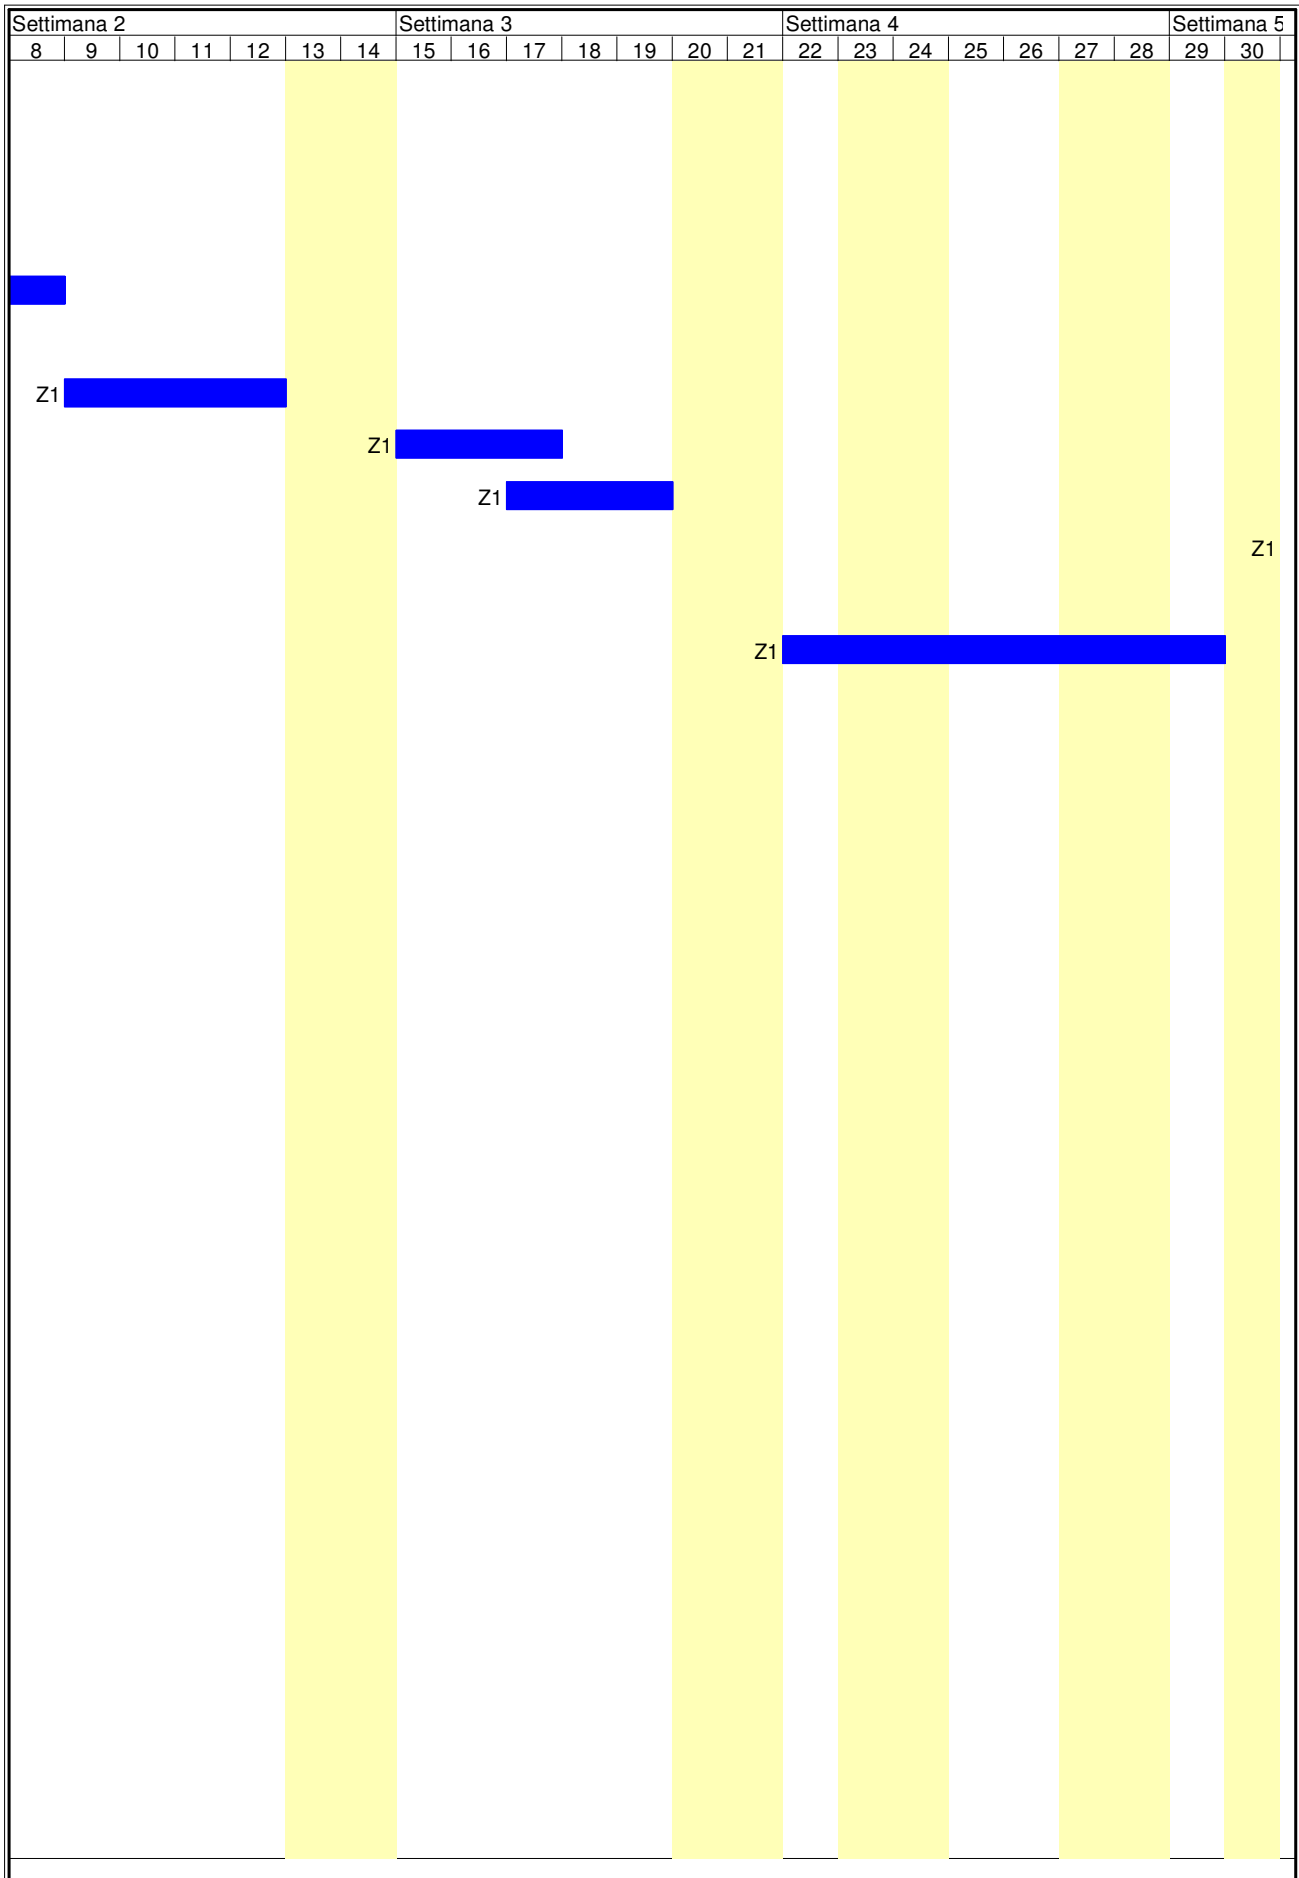gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	ettimana -1		Settimana 1							
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g		Z1								
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g	1 g		Z1								
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2 g			Z1							
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	2 g					Z1					
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g									Z1	
Smobilizzo del cantiere	4 g										
Asportazione di strato di usura e collegamento	4 g										
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	3 g										
Scavo a sezione ristretta	3 g										
Realizzazione di impianto elettrico interno	9 g										
Posa di conduttura elettrica	10 g										
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	4 g										
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	5 g										
Rinterro di scavo	5 g										
Posa di pali per pubblica illuminazione	6 g										
Montaggio di apparecchi illuminanti	10 g										
LEGENDA Zona:											
Z1 = ZONA UNICA											



5					Settimana 6								Settimana 7					Settimana 8				
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
											Z1											

Settimana 9			Settimana 10						Settimana 11													
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
																						
																						
																					Z1 	
																					Z1 	
																						

Settimana 12							Settimana 13							Settimana 14							Settir	
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
Z1																						
																						Z1
